


Projet « BDFK » (Base de données)

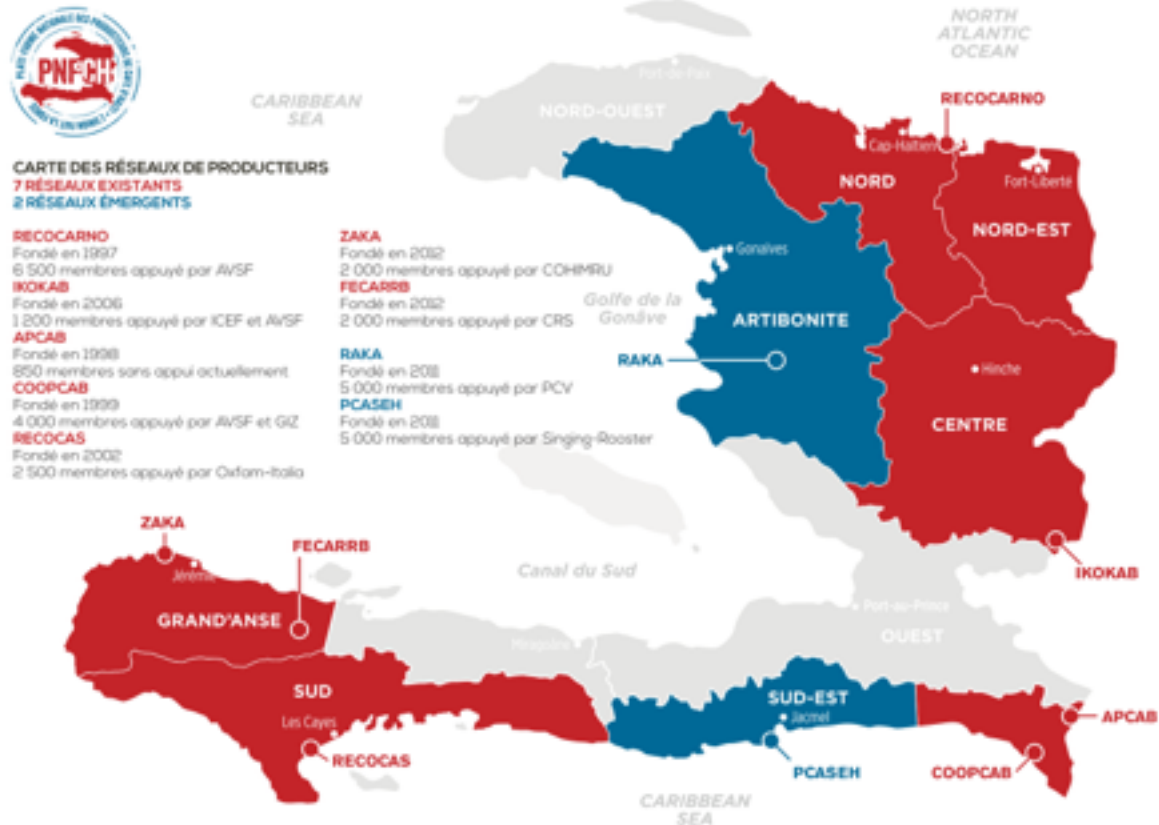

Description générale du projet:

Ce projet vise à créer un système de gestion de l'information au sujet de la filière café haïtienne permettant aux producteurs d'avoir accès aux données essentielles au sujet de cette industrie (agriculture, production, transformation, commercialisation) et à la PNPCH d'augmenter sa visibilité et ses services en fournissant à ses membres une version imprimée d'un « Répertoire de la Filière Café haïtienne ».

Phase-1 (de juillet à novembre 2013):

Conception du premier module de la base de données FileMaker
Il s'agit du module « contact » visant à inventorier tous les acteurs de la filière

Le plan d'action initial était de faire rassembler par une équipe haïtienne les données constituant le premier Répertoire « Filière café haïtienne » pendant que l'équipe du Québec s'occupait du financement du projet, de la programmation du système informatique et de la conception du prototype du Répertoire. Nous nous étions donné l'échéance de la fin de novembre afin de profiter du fait que l'Exécutif de la PNPCH allait être rassemblé à Thiotte pour participer au Forum de caractérisation du café haïtien où nous étions invité, l'objectif visé étant de lancer le Répertoire à cet événement.

L'équipe d'Haïti et celle du Québec se mobilisèrent donc et se mirent en action pour accomplir les différentes tâches. Assez rapidement nous nous sommes aperçus que la cueillette des données en Haïti était plus compliquée que nous ne l'avions anticipé. Et lorsque le moment d'envoyer la maquette du répertoire en impression fut arrivé nous avons dû nous résigner à reporter en 2014 la première édition. Tout le reste était en place: le financement était assuré, la base de données était configurée. le système informatique était programmé, la conception graphique du répertoire était faite et nous en avons imprimé le prototype.

La cueillette des données relatives aux différentes organisations de producteurs de café d'Haïti a été retardée par une succession d'embûches techniques et humaines ainsi que par le fait que les réseaux régionaux de producteurs étaient en période d'élection, ce qui entraînait des changements au sein de l'assemblée de ces délégués régionaux, et du nouvel exécutif dont l'officialisation a été retardée considérablement. Nous nous sommes donc résigné à repousser la date de publication du Répertoire jusqu'à ce que cette réorganisation de la PNPCH soit accomplie, tout en gardant comme objectif de rencontrer l'Exécutif de la PNPCH et valider avec eux le prototype du Répertoire et planifier la suite. Ce qui fut fait. Mais rien ne se passa en 2014 car l'assemblée générale de la PNPCH et l'élection du nouvel exécutif n'ont pas pu être faites.

Phase-2: (février 2015):

Afin de relancer ce projet nous décidons de le fragmenter en plus petites étapes réalistes qui sont confiées sous forme de contrat à des individus compétents et disponibles.

Contrat BDFK-2.1

Le travail consiste à valider des informations-contact recueillies jusqu'à présent au sujet d'entreprises et d'organisations qui sont des acteurs de la filière café haïtienne.

- nOula fournira les données à valider (listes de 2012 et 2013) ainsi qu'un tableau sur lequel les données validées devront être entrées.
- On parle d'environ 40 organisations (ou entreprise) c'est à dire un total d'une quarantaine d'enregistrements
- Le travail est confié à Ralph Thomassaint, candidat proposé par la PNPCH et avec qui Yolaine Rouleau a déjà une excellente expérience de collaboration.
- Un budget de \$400 USD est établi pour ce mandat et un contrat est rédigé pour bien en décrire les modalités d'exécution et de paiement.
- jcs a transféré \$485 canadien à Yolaine pour qu'elle puisse faire les 3 paiements à Ralph en fonction des résultats (listes validées envoyées par courriel à jcs)
- Les données validées ont été transmises par Ralph à jcs au cours de la dernière semaine de février. Puis il nous a transmis la liste du nouvel exécutif de la PNPCH heures à peine après la fin des élections (le 6 mars).
- ce qui nous a permis, après une nuit de travail acharné de pouvoir publier une première liste de contacts des acteurs de la filière café haïtienne. à temps pour le forum café du 7 mars 2015.
- Mission accomplie: jcs va facturer AQANU pour le \$485 transféré à Yolaine pour payer Ralph Thomassaint

BDFK-2.2

Cette première liste sera complétée par les informations-contacts de tous les participants du forum-café du 7 mars que Ralph a recueilli et va envoyer à jcs. Puis jcs fera une première mise à jour de la liste issue du contrat BDK-2.1 en y ajoutant ces données.

Il ne devrait pas y avoir de frais relatifs à cette l'étape BDFK-2.2

BDFK-3

Pour la poursuite des étapes ultérieures de ce projet qui vont comprendre l'ajout d'autres modules relatifs à la production caféière, nous proposons de continuer de les piloter en relançant le comité « communications (qui a initié le projet BDFK en 2013 et l'a coordonné jusqu'à présent) en y incluant un membre du nouvel exécutif de la PNPCH, un membre de l'INCAH, et une ressource technique bénévole (informatique) issue de la diaspora.

Cette proposition inclusive (telle qu'élaborée de façon préliminaire avec Yolaine Rouleau aujourd'hui) marque une nouvelle étape dans le développement de la filière café haïtienne.
